



OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO


LOCALIDAD: ENSENADA
PLAN DE TRABAJO

	ITEM	DESCRIPCION	MONTO	% INCID.	QUINCENA 1	QUINCENA 2	QUINCENA 3	QUINCENA 4	QUINCENA 5	QUINCENA 6	QUINCENA 7	QUINCENA 8	QUINCENA 9	QUINCENA 10	QUINCENA 11	QUINCENA 12	QUINCENA 13	QUINCENA 14
SUM	A1.	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 7.224.814,76	1,75%	60,00%	20,00%	20,00%											
	A2.	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 6.302.284,41	1,53%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%								
	A3.	ESTRUCTURAS	\$ 19.971.390,44	4,85%		10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%							
	A4.	ALBAÑILERIA	\$ 9.153.206,15	2,22%					10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
	A5.	CUBIERTAS	\$ 4.498.325,90	1,09%								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
	A6.	PISOS Y ZOCALOS	\$ 2.866.537,15	0,70%								10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
	A7.	REVESTIMIENTOS	\$ 571.772,87	0,14%										20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
	A8.	CIELORRASOS	\$ 1.497.182,69	0,36%									10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
	A9.	PINTURAS	\$ 1.061.137,70	0,26%										20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	
	A10.	CARPINTERIAS	\$ 5.966.059,76	1,45%										25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	10,00%
	A11.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 5.238.567,70	1,27%	10,00%	10,00%	10,00%				10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
	A12.	INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 5.695.647,50	1,38%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
	A13.	INSTALACIONES TERMOMECAICAS (PROVISION Y COLOCACION)	\$ 1.368.140,54	0,33%								10,00%	10,00%			30,00%	30,00%	20,00%
	A14.	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (PROVISION Y COLOCACION)	\$ 4.414.311,89	1,07%							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
	A15.	VEGETACIÓN (PROVISION Y PLANTACION)	\$ 131.832,79	0,03%										25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%
	A16.	VARIOS	\$ 5.406.276,83	1,31%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,70%
ESP. PUBLICO	B1.	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 22.784.670,66	5,53%							10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
	B2.	SOLIDOS Y CORDONES	\$ 75.859.029,61	18,42%								10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
	B3.	ILUMINACIÓN	\$ 30.494.572,73	7,40%										10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%
	B4.	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO	\$ 20.194.414,81	4,90%												30,00%	40,00%	30,00%
	B5.	INTERVENCION ARTISTICA MURO EXISTENTE	\$ 6.468.993,29	1,57%								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	B6.	HORMIGON Y PREMOLDEADOS	\$ 18.358.736,11	4,46%											20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
	B7.	FORESTACIÓN - PROVISION Y PLANTACION	\$ 6.928.305,64	1,68%												30,00%	30,00%	20,00%
PAVIMENTO - BAÑOS Y VESTUARIO	C1.	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO - PREDIMENSIONADAS	\$ 3.801.792,15	0,92%				30,00%	50,00%	20,00%								
	C2.	ALBAÑILERIA	\$ 4.288.324,52	1,04%						10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					
	C3.	CUBIERTAS	\$ 1.784.723,54	0,43%								20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			
	C4.	PISOS Y ZOCALOS	\$ 857.757,76	0,21%										50,00%	50,00%			
	C5.	REVESTIMIENTOS	\$ 2.696.986,39	0,65%										20,00%	50,00%	30,00%		
	C6.	CIELORRASOS	\$ 819.890,79	0,20%											50,00%	50,00%		
	C7.	PINTURAS	\$ 793.139,51	0,19%												60,00%	40,00%	
	C8.	CARPINTERIAS	\$ 4.975.013,01	1,21%												80,00%	20,00%	
	C9.	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 3.470.158,35	0,84%					10,00%	20,00%				30,00%	30,00%	10,00%		
	C10.	INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 7.612.808,50	1,85%					10,00%					40,00%	50,00%			
	C11.	INSTALACION CONTRA INCENDIO	\$ 45.041,30	0,01%												100,00%		
	C12.	MOBILIARIO	\$ 86.622,85	0,02%											100,00%			
PAVIMENTO	D1.	MOVIMIENTO DE SUELOS	\$ 1.430.057,82	0,35%	75,00%	25,00%												
	D2.	PAVIMENTOS	\$ 31.848.988,93	7,73%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										
		SUBTOTAL	\$ 326.967.517,35															
		GASTOS IMPOSITIVOS	\$ 76.837.366,58	18,65%	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
		HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 8.088.048,84	1,96%	9,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
		TOTAL	\$ 411.892.932,77	100,00%														
		% de avance mensual previsto	MENSUAL		5,29%	5,15%	5,12%	5,16%	3,77%	3,45%	3,70%	6,09%	8,39%	10,42%	12,10%	14,38%	11,23%	5,76%
		% de avance acumulado previsto	ACUMULADO		5,29%	10,44%	15,56%	20,72%	24,48%	27,93%	31,63%	37,72%	46,11%	56,53%	68,63%	83,01%	94,24%	100,00%
		Monto de Inversión Mensual Previsto	MENSUAL		\$ 21.782.524,04	\$ 21.212.740,48	\$ 21.085.421,89	\$ 21.255.709,33	\$ 15.507.873,08	\$ 14.209.334,74	\$ 15.227.566,60	\$ 25.074.621,70	\$ 34.566.126,57	\$ 42.902.108,60	\$ 49.837.597,09	\$ 59.230.762,60	\$ 46.256.095,51	\$ 23.744.450,53
		Monto acumulado previsto	ACUMULADO		\$ 21.782.524,04	\$ 42.995.264,53	\$ 64.080.686,41	\$ 85.336.395,74	\$ 100.844.268,82	\$ 115.053.603,56	\$ 130.281.170,16	\$ 155.355.791,86	\$ 189.921.918,43	\$ 232.824.027,03	\$ 282.661.624,12	\$ 341.892.386,72	\$ 388.148.482,23	\$ 411.892.932,77



OBRA: MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

LOCALIDAD: ENSENADA
CURVA DE AVANCE DE OBRA

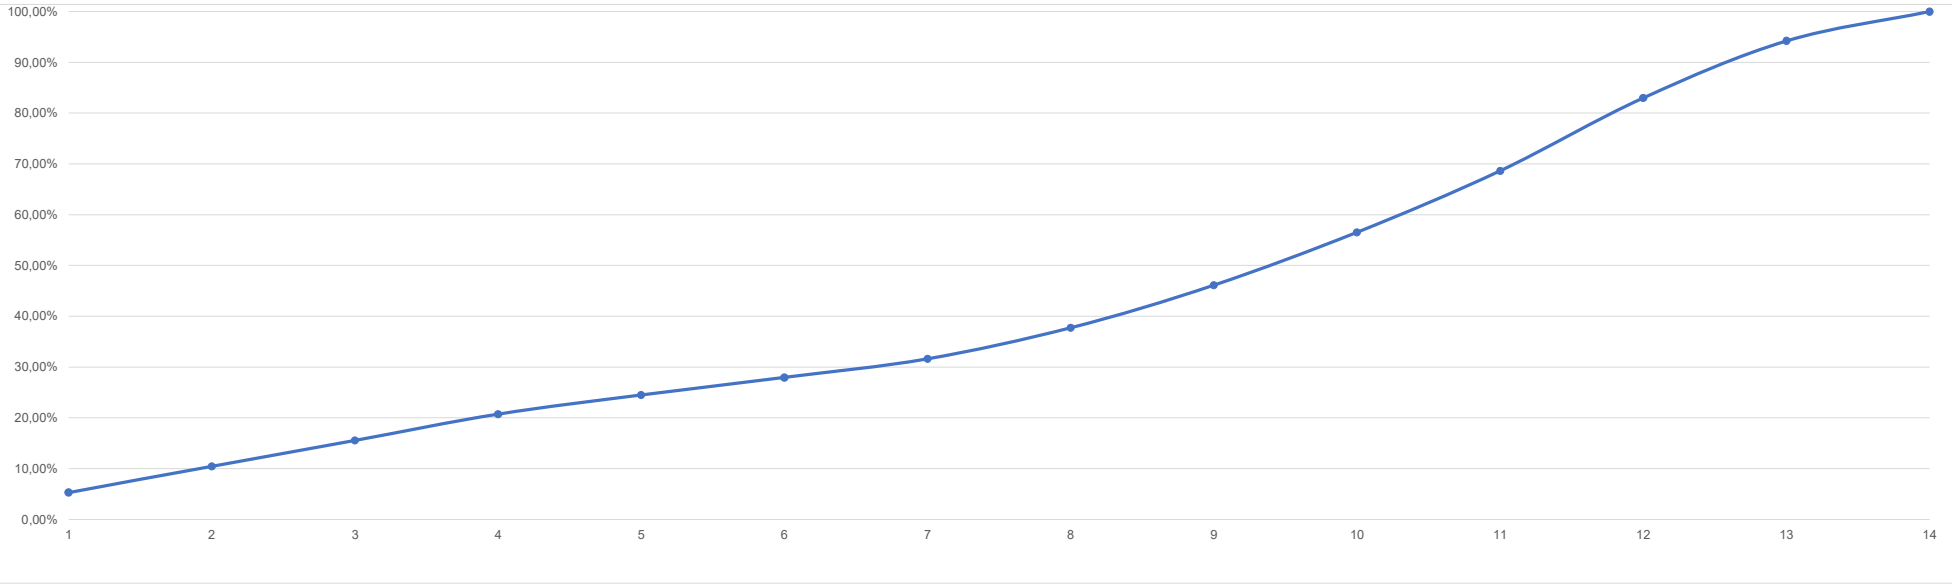



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2023 - Año de la democracia Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: PLAN DE TRABAJO_MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y CONSTRUCCION
DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
